



Acta de Entrega - Recepción

Obra por Contrato

Fecha: 10:30 21 ABRIL 2024
Hora día mes año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Proyecto y Descripción de la Obra K131-FIII. -AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE
ENERGIA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CUNDUACAN, HUIMANGO 3RA. SECC.

Localidad: 029.-HUIMANGO 3RA SECC. (LOS CERROS) Municipio: Cunduacán

Programa: K018.-MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL

Subprograma: 623.- CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,
ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. Unidad: ML Cantidad: 2,600

Fechas: Inicio Programada: 22/02/24 Terminación Programada: 21/04/24

Supervisor del Ayuntamiento: ING. JOSE ARTURO BADAL JUAREZ

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: PROVEEDURIA Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S. A DE C.V.

R.F.C.: PMI0202277FA

Domicilio: PROL. DE GUADALUPE VICTORIA No.588, COL. SANTA MARIA DE GUADALUPE

Contrato: CU-07-K131-FIII-2024

Importe: \$2,865,587.08 Fecha: 15/02/2024 Anticipo: \$ 859,676.12

Modalidad de Adjudicación: invitación a cuando menos tres personas

Fecha de Adjudicación: 13 de Febrero de 2024

Fecha Inicio según Contrato: 22/02/24 Fecha de Term. Según Contrato: 21/04/24

Fecha real inicio de obra: 22/02/24 Fecha real de terminación de Obra: 21/04/24

Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. RAUL ESQUINCA ROSALES



**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**

GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: 24A07011 Importe: \$ 859,676.12 Fecha de Exp.: 14/02/2024

Nombre de la Cia. Afianzadora: DORAMA S.A DE C.V. Vigencia: 60 DIAS

Fianza de cumplimiento No.: 24A07013 Importe: \$ 286,558.70 Fecha de Exp.: 14/02/2024

Nombre de la Cia. Afianzadora: DORAMA S.A DE C.V. Vigencia: 60 DIAS

Fianza de vicios ocultos No.: 24A23357 Importe: \$ 286,556.40 Fecha de Exp.: 21/04/2024

Nombre de la Cia. Afianzadora: DORAMA S.A DE C.V. Vigencia: 1 AÑO

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan: **AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION SUM. Y COLOCACION DE POSTES, TRANSFORMADORES DE 15, 25 Y 37.5 KVA, SUM. Y COL. DE LUMINARIAS, SUM E INST. DE CONDUCTOR ELECTRICO EN MEDIA Y BAJA TENSION.**

Metas alcanzadas: Unidad ML Cantidad 2,185.80

Población beneficiada: 474 PERSONAS Localidades beneficiadas: 029.-HUIMANGO 3RA SECC.

(LOS CERROS)

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo	31- 30/01/2024	\$ 2,869,637.70

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal

INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Fecha	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
ESTIMACION No: 01 (DE TRABAJOS EJECUTADOS)	01/03/2024	22/02/2024-29/02/2024	\$ 1,012,799.08	\$ 309,951.44
ESTIMACION No: 02 (DE TRABAJOS EJECUTADOS)	16/03/2024	01/03/2024-15/03/2024	\$ 639,819.16	\$ 195,806.73
ESTIMACION 03 (DE TRABAJOS EJECUTADOS)	02/04/2024	16/03/2024-31/03/2024	\$ 241,011.46	\$ 73,757.82
ESTIMACION No: 04 (DE TRABAJOS EJECUTADOS)	16/04/2024	01/04/24-15/04/2024	\$ 282,598.32	\$ 86,484.84
ESTIMACION No: 05 (DE CONCEPTOS NO PREVISTOS)	16/04/2024	01/04/24-15/04/2024	\$ 40,203.48	\$ 12,303.65
ESTIMACION No: 06 (TRABAJOS EJECUTADOS)	16/05/2024	16/04/2024-21/04/2024	\$ 370,763.74	\$ 113,466.49
ESTIMACION No: 07 FINIQUITO (DE CANTIDADES ADICIONALES)	16/04/2024	16/04/2024-21/04/2024	\$ 278,368.79	\$ 85,197.37

Importe del Contrato (\$) 2,869,637.70 Importe total estimado (\$) 2,865,564.03

Importe deducciones (\$) 876,968.34 Saldo por cancelar (\$) 23.05

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.

ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN.
TABASCO


Cargo RESIDENTE DE OBRAS

Nombre y Firma ING. JOSE ARTURO BADAL JUAREZ

Por el Contratista: PROVEEDURIA Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S. A DE C.V.

Cargo REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y Firma C. PILAR DEL CARMEN CASTILLO GOMEZ



RECIBE:

Comité () Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

José Alfredo Gomez Gomez
C.

SECRETARIO

Lucia M.P. Lucia Martinez Perez
C.

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

FABIAN J. H. FABIAN JELOS TOVE TORRES
C.

SEGUNDO VOCAL

Santana Vicente Arias
C.


TERCER VOCAL

Francisco Badal Com.
C.

C.



**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios"
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**

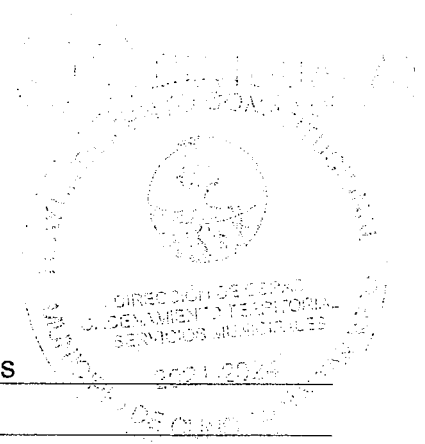

INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Nombre y Firma Arq. Karla Nohemi Vinagre Ruiz

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Coordinador del Ramo 33

Nombre y Firma Lic. José Héctor Vicente Castañeda

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:
