



Acta de Entrega - Recepción

Obra por Contrato

Fecha: 10:00 13 Agosto 2024
Hora día mes año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Proyecto y Descripción de la Obra K146-FIII. -AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE
ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN CUNDUACAN, JOSE MARIA MORELOS Y
PAVON (MORELITOS)ATENAS), Localidad: 072.-JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (MORELITOS)

Municipio: **Cunduacán**

Programa: K018.-MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL

Subprograma: 623.- CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,
ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. Unidad: ML Cantidad: 530

Fechas: Inicio Programada: 15/07/24 Terminación Programada: 13/08/24

Supervisor del Ayuntamiento: ING. JOSE ARTURO BADAL JUAREZ

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: RAUL ESQUINCA ROSALES. R.F.C.: EURR751013J13

Domicilio: CALLE FRANCISCO I MADERO No. 607, COL. CENTRO

Contrato: CU-95-K146-FIII-2024

Importe: \$892,136.63 Fecha: 08/07/2024 Anticipo: No aplica

Modalidad de Adjudicación: Adjudicación Directa

Fecha de Adjudicación: 06 de Julio de 2024

Fecha Inicio según Contrato: 15/07/24 Fecha de Term. Según Contrato: 13/08/24

Fecha real inicio de obra: 15/07/24 Fecha real de terminación de Obra: 13/08/24

Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. RAUL ESQUINCA ROSALES



GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: _____ Importe: \$ _____ Fecha de Exp.: _____

Nombre de la Cia. Afianzadora: _____ Vigencia: _____

Fianza de cumplimiento No.: 3002024014219 Importe: \$ 89,213.66 Fecha de Exp.: 08/07/2024

Nombre de la Cia. Afianzadora: AVLA SEGUROS, S.A. DE C.V. Vigencia: 30 DIAS

Fianza de vicios ocultos No.: 3002024016272 Importe: \$ 89139.18 Fecha de Exp.: 13/08/2024

Nombre de la Cia. Afianzadora: AVLA SEGUROS, S.A. DE C.V. Vigencia: 1 AÑO

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan: AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION SUM. Y COLOCACION DE POSTES, TRANSFORMADORES DE 15 Y 25 KVA, SUM. Y COL. DE LUMINARIAS, SUM E INST. DE CONDUCTOR ELECTRICO EN MEDIA Y BAJA TENSION.

Metas alcanzadas: Unidad ML Cantidad 489.90

Población beneficiada: 1,994 PERSONAS Localidades beneficiadas: 072.-JOSE MARIA

MORELOS Y PAVON (MORELITOS)

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo	31- 30/01/24	\$ 894,631.79

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		

INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Fecha	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
ESTIMACION No: 01 (DE TRABAJOS EJECUTADOS)	16/08/2024	15/07/24-31/07/2024	\$ 484,106.43 ✓	\$ 2,921.34 ✓
ESTIMACION No: 02 (DE CANTIDADES ADICIONALES)	16/08/2024	01/08/24-13/08/2024	\$ 146,009.85 ✓	\$ 881.09 ✓
ESTIMACION No: 03 FINIQUITO (DE TRABAJOS EJECUTADOS)	16/08/2024	01/08/24-13/08/2024	\$ 261,275.60 ✓	\$ 1,576.67 ✓

Importe del Contrato (\$) 892,136.63 Importe total estimado (\$) 891,391.88 ✓

Importe deducciones (\$) 5,379.10 ✓ Saldo por cancelar (\$) 774.75

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

Cargo RESIDENTE DE OBRAS

Nombre y Firma ING. JOSE ARTURO BADAL JUAREZ

Por el Contratista: RAUL ESQUINCA ROSALES

Cargo REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y Firma ING. RAUL ESQUINCA ROSALES

RECIBE:

Comité (X) Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

SECRETARIO

C. Asocion de los Angeles Izquierdo Sanchez

C. Efran Martinez Perez

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

SEGUNDO VOCAL


C. Cociano Mora Lucas


C. Adrian Burelo Jimenez

TERCER VOCAL

C. Ruben Darío Quevedo Almeida

C. Natalia Estefania Perez Jimenez





INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA


Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Nombre y Firma Arq. Karla Nohemi Vinagre Ruiz

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Coordinador del Ramo 33

Nombre y Firma Lic. José Héctor Vicente Castañeda

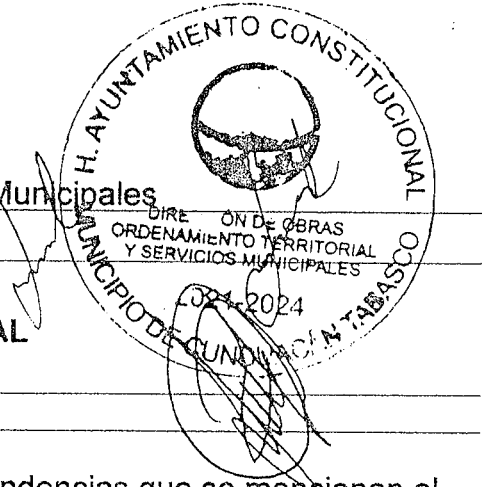

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE CUNDUACÁN, TABASCO

2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



CUNDUACÁN

CUNDUACÁN, TABASCO A 13 DE AGOSTO DE 2024

RAUL ESQUINCA ROSALES

CALLE FRANCISCO I MADERO No. 607, COL. CENTRO
CARDENAS, TABASCO

ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO No: CU-95-K146-FIII-2024

CON FECHA 13 DE AGOSTO, LE COMUNICÓ QUE SE REALIZÓ LA RECEPCION FISICA CORRESPONDIENTE A LA CONCLUSIÓN Y/O TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO No. CU-95-K146-FIII-2024 Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 164, 165 Y 166 DE SU REGLAMENTO, Y LA CLAUSULA DECIMA TERCERA DEL CONTRATO, LE COMUNICO QUE SE VERIFICARON LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO, LOS CUALES FUERON TOTALMENTE CONCLUIDOS EL 13 DE AGOSTO DE 2024 POR LO QUE SE PROCEDERÁ A LA RECEPCION FÍSICA DE LA OBRA CUYOS DATOS SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

DATOS DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	CU-95-K146-FIII-2024
FECHA DE FORMALIZACION DEL CONTRATO:	8 de julio de 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	K146-FIII.-AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EN CUNDUACAN, JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (MORELITOS)
UBICACIÓN:	072.-JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (MORELITOS)
IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO EN PESOS:	\$ 892,136.63
PLAZO DE EJECUCION CONTRATO:	30 DÍAS NATURALES
FECHA DE INICIO CONTRATO:	15 de julio de 2024
FECHA DE TERMINACION CONTRATO:	13 de agosto de 2024
MONTO REAL EJERCIDO:	\$ 891,391.88
FECHA DE INICIO REAL:	15 de julio de 2024
FECHA DE TERMINACION REAL:	13 de agosto de 2024
PLAZO DE EJECUCION REAL:	30 DÍAS NATURALES

DICHOS TRABAJOS SE RECIBEN EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, RESERVÁNDOSE EL H. AYUNTAMIENTO EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE PROCEDAN POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, Y/O POR CUALQUIER CONCEPTO A QUE H. AYUNTAMIENTO TENGA DERECHO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, SUS ANEXOS Y CONVENIOS.

ASI MISMO, DE CONFORMIDAD EN EL ARTICULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DEBERÁ ENTREGAR A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PREVIO A DICHA FECHA, LA GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO DURANTE SU EJECUCIÓN, PRESENTAR EL ACUSE DE RECIBO Y LA VALIDACIÓN CORRESPONDIENTE, EN EL ACTO QUE SE LEVANTARA EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA. (LAS CUALES SOLO APLICA PARA MONTOS MAYORES DE CIEN MIL PESOS)

ARQ. KARLA NOHEMÍ VINAGRE RUIZ
DIR. DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERV.MPALES.

ING. JOSE ARTURO BADAL JUAREZ
RESIDENTE DE OBRA
